График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов
0		**График тендеров 2023-2025**	**790 дней**	**Ср 01.11.23**	**Пт 11.12.26**		
1		**1 ДОУ 260 мест К21 СД 20**	**20 дней**	**Пт 26.01.24**	**Чт 22.02.24**		
2		1.1 Металлоконструкции (общедомовой металл)	20 дней	Пт 26.01.24	Чт 22.02.24		
3		**2 ДОУ на 220 мест К23 СД 20**	**99 дней**	**Ср 01.11.23**	**Пт 29.03.24**		
4		2.1 Металлоконструкции (изделия из нержавеющего металла)	29 дней	Пн 25.12.23	Пт 09.02.24		
5		2.2 Монтаж ИТП	28 дней	Вт 19.12.23	Пт 02.02.24		
6		2.3 Оборотная система водоподготовки бассейнов	44 дней	Ср 24.01.24	Ср 27.03.24		
7		2.4 Кровля	36 дней	Чт 07.12.23	Пт 02.02.24		
8		2.5 Вертикальный транспорт	61 дней	Ср 01.11.23	Пт 02.02.24		
9		2.6 Внутренние отделочные работы	25 дней	Пт 22.12.23	Пт 02.02.24		
10		2.7 Монтируемое оборудование	33 дней	Пн 29.01.24	Пт 15.03.24		
11		2.8 Устройство НЭС	20 дней	Пн 29.01.24	Пт 23.02.24		
12		2.9 Устройство НСС	23 дней	Пн 12.02.24	Пт 15.03.24		
13		2.10 Устройство НО	33 дней	Пн 12.02.24	Пт 29.03.24		
14		2.11 Благоустройство	33 дней	Пн 12.02.24	Пт 29.03.24		
15		**3 школа на 825 уч-ся К26 СД 20**	**137 дней**	**Пн 29.01.24**	**Пт 16.08.24**		
16		3.1 Прифундаментный дренаж	23 дней	Пн 29.01.24	Чт 29.02.24		
17		3.2 Кладка стен внутренних и перегородок	21 дней	Ср 14.02.24	Пт 15.03.24		
18		3.3 Фасады	24 дней	Вт 12.03.24	Пт 12.04.24		
19		3.4 Металлоконструкции (общедомовой металл)	23 дней	Ср 13.03.24	Пт 12.04.24		
20		3.5 Окна	23 дней	Ср 20.03.24	Пт 19.04.24		
21		3.6 Витражи	23 дней	Ср 20.03.24	Пт 19.04.24		
22		3.7 Внутренние электромонтажные работы	23 дней	Вт 30.01.24	Пт 01.03.24		
23		3.8 Внутренние сантехнические системы	21 дней	Чт 29.02.24	Пт 29.03.24		
24		3.9 Монтаж ИТП	20 дней	Пн 22.04.24	Пт 24.05.24		
25		3.10 Оборотная система водоподготовки бассейнов	24 дней	Вт 16.07.24	Пт 16.08.24		
26		3.11 Кровля	24 дней	Вт 12.03.24	Пт 12.04.24		
27		3.12 Вертикальный транспорт	20 дней	Пн 22.04.24	Пт 24.05.24		
28		3.13 Внутренние слаботочные сети	24 дней	Вт 23.04.24	Пт 31.05.24		
29		3.14 Внутренние отделочные работы	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
30		3.15 Монтируемое оборудование	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24		
31		3.16 Немонтируемое оборудование	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24		
32		3.17 Устройство НВК	20 дней	Пн 18.03.24	Пт 12.04.24		
33		3.18 Устройство НТС	20 дней	Пн 18.03.24	Пт 12.04.24		
34		3.19 Устройство НЭС	20 дней	Пн 20.05.24	Пн 17.06.24		
35		3.20 Устройство НСС	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24		
36		3.21 Устройство НО	20 дней	Пн 20.05.24	Пн 17.06.24		
37		3.22 Благоустройство	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24		
38		**4 школа на 1750 уч-ся К48(49) СД 21**	**39 дней**	**Пн 04.12.23**	**Пт 02.02.24**		
39		4.1 Монтируемое оборудование	20 дней	Пн 08.01.24	Пт 02.02.24		
40		4.2 Устройство НО	34 дней	Пн 04.12.23	Пт 26.01.24		
41		**5 ДОУ на 200 мест К16 Ю 31-18**	**370 дней**	**Чт 21.12.23**	**Пт 20.06.25**		
42		5.1 Временное энергоснабжение площадки	15 дней	Чт 22.02.24	Пт 15.03.24		
43		5.2 Откопка котлована	31 дней	Чт 29.02.24	Пт 12.04.24		
44		5.3 Устройство ростверка	32 дней	Чт 14.03.24	Пт 26.04.24		
45		5.4 Монолитный каркас	32 дней	Чт 14.03.24	Пт 26.04.24		
46		5.5 Монтаж БК	32 дней	Чт 14.03.24	Пт 26.04.24		
47		5.6 Кладка стен внутренних и перегородок	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24		
48		5.7 Кровля	24 дней	Вт 25.06.24	Пт 26.07.24		
49		5.8 Фасады	21 дней	Пт 26.07.24	Пт 23.08.24		
50		5.9 Витражи	19 дней	Вт 02.07.24	Пт 26.07.24		
51		5.10 Окна	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24		
52		5.11 Металлоконструкции	24 дней	Вт 20.08.24	Пт 20.09.24		
53		5.12 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
54		5.13 Монтаж АСКУЭ	19 дней	Вт 01.04.25	Пт 25.04.25		
55		5.14 Внутренние сантехнические системы	23 дней	Вт 21.05.24	Пт 21.06.24		
56		5.15 Отделка	23 дней	Вт 21.05.24	Пт 21.06.24		
57		5.16 Вертикальный транспорт	23 дней	Ср 21.05.25	Пт 20.06.25		
58		5.17 Оборотная система водоподготовки бассейнов	19 дней	Вт 01.04.25	Пт 25.04.25		
59		5.18 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24		
60		5.19 ИТП	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24		
61		5.20 Монтируемое оборудование	24 дней	Вт 01.04.25	Пт 02.05.25		
62		5.21 Прифундаментный дренаж	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
63		5.22 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	23 дней	Ср 10.04.24	Пт 17.05.24		
64		5.23 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24		
65		5.24 Устройство наружных сетей электроснабжения	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25		
66		5.25 Устройство наружных сетей связи	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25		
67		5.26 Устройство наружных сетей наружного освещения	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25		
68		5.27 Благоустройство	22 дней	Чт 20.02.25	Пт 21.03.25		
69		**6 школа на 1200 уч-ся К17 Ю 31-18**	**216 дней**	**Пн 29.01.24**	**Пт 06.12.24**		
70		6.1 Временное энергоснабжение площадки	15 дней	Пн 29.01.24	Пт 16.02.24		
71		6.2 Сваи	33 дней	Пн 05.02.24	Пт 22.03.24		
72		6.3 Откопка котлована	46 дней	Ср 21.02.24	Пт 26.04.24		
73		6.4 Прифундаментный дренаж	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24		
74		6.5 Монолитный каркас	46 дней	Ср 21.02.24	Пт 26.04.24		
75		6.6 Монтаж БК	46 дней	Ср 21.02.24	Пт 26.04.24		

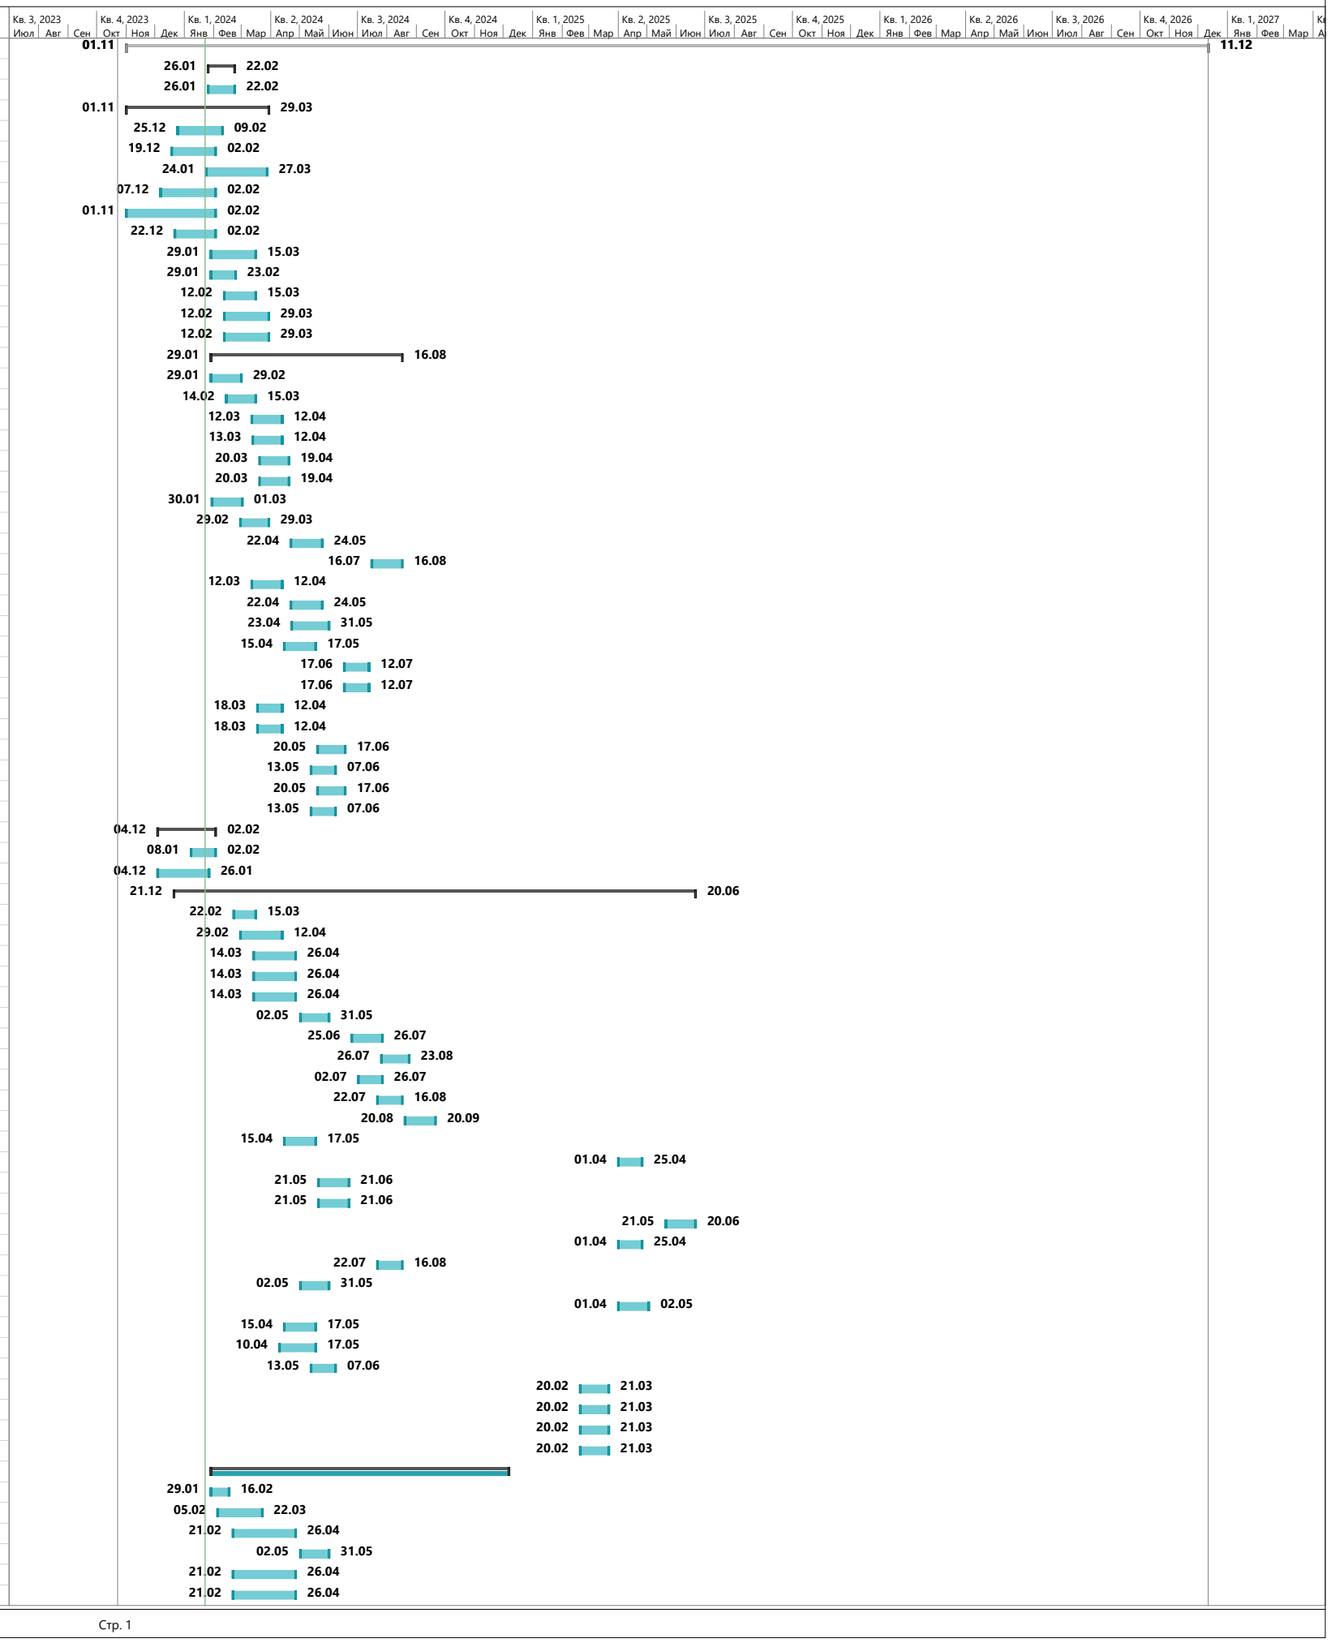

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов
76		6.7 Кладка стен внутренних и перегородок	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24		
77		6.8 Фасады	20 дней	Пн 23.09.24	Пт 18.10.24		
78		6.9 Металлоконструкции (балки, фермы)	22 дней	Чт 08.08.24	Пт 06.09.24		
79		6.10 Металлоконструкции (огнезащита металла)	21 дней	Пт 08.11.24	Пт 06.12.24		
80		6.11 Металлоконструкции (общедомой)	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24		
81		6.12 Витражи	20 дней	Пн 09.09.24	Пт 04.10.24		
82		6.13 Кровля	24 дней	Вт 17.09.24	Пт 18.10.24		
83		6.14 Окна	23 дней	Ср 17.07.24	Пт 16.08.24		
84		6.15 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 18.03.24	Пт 12.04.24		
85		6.16 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24		
86		6.17 Отделка (черновая), в т.ч. спец. помещения с окраской за 1 раз) с прогревом	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24		
87		6.18 Отделка (чистовая), вкл. МГН с прогревом	20 дней	Пн 17.06.24	Пт 12.07.24		
88		6.19 Вертикальный транспорт	22 дней	Чт 01.08.24	Пт 30.08.24		
89		6.20 Оборотная система водоподготовки бассейнов	21 дней	Пт 08.11.24	Пт 06.12.24		
90		6.21 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 22.07.24	Пт 16.08.24		
91		6.22 ИТП	20 дней	Пн 08.07.24	Пт 02.08.24		
92		6.23 Монтируемое оборудование	28 дней	Вт 08.10.24	Пт 15.11.24		
93		6.24 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	21 дней	Пт 22.03.24	Пт 19.04.24		
94		6.25 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Чт 02.05.24	Пт 31.05.24		
95		6.26 Устройство наружных сетей электроснабжения	22 дней	Ср 22.05.24	Пт 21.06.24		
96		6.27 Устройство наружных сетей связи	20 дней	Пн 24.06.24	Пт 19.07.24		
97		6.28 Устройство сетей наружного освещения	20 дней	Пн 24.06.24	Пт 19.07.24		
98		6.29 Благоустройство, вкл. МГН	20 дней	Пн 24.06.24	Пт 19.07.24		
99		**7 к.12, 14-17 Ю 34-7 (I этап)**	**454 дней**	**Ср 22.05.24**	**Пт 27.02.26**		
100		7.1 Снос зелёных насаждений	22 дней	Ср 22.05.24	Пт 21.06.24		
101		7.2 Выторфовка и вертикальная планировка	22 дней	Ср 05.06.24	Пт 05.07.24		
102		7.3 Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	23 дней	Ср 10.07.24	Пт 09.08.24		
103		7.4 Геодезическая разбивочная основа	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
104		7.5 Временное энергоснабжение площадки	20 дней	Пн 05.08.24	Пт 30.08.24		
105		7.6 Сваи	20 дней	Пн 05.08.24	Пт 30.08.24		
106		7.7 Откопка котлована	21 дней	Пт 04.10.24	Пт 01.11.24		
107		7.8 Прифундаментный дренаж	23 дней	Пн 09.12.24	Пт 17.01.25		
108		7.9 Монтаж БК	20 дней	Пн 30.09.24	Пт 25.10.24		
109		7.10 Монолитный каркас (75 м)	21 дней	Пт 04.10.24	Пт 01.11.24		
110		7.11 Кладка стен внутренних и перегородок (в т.ч. ограждение переходных балконов)	20 дней	Пн 03.02.25	Пт 28.02.25		
111		7.12 Общедомовой металл	20 дней	Пн 09.09.24	Пт 04.10.24		
112		7.13 Кровля	23 дней	Ср 07.08.24	Пт 06.09.24		
113		7.14 Окна	20 дней	Пн 07.04.25	Пт 02.05.25		
114		7.15 Витражи	23 дней	Ср 06.08.25	Пт 05.09.25		
115		7.16 Внутренние электромонтажные работы	21 дней	Ср 04.12.24	Пт 10.01.25		
116		7.17 Монтаж АСКУЭ	21 дней	Пт 30.01.26	Пт 27.02.26		
117		7.18 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Пн 07.04.25	Пт 02.05.25		
118		7.19 Отделка, в т.ч. МГН (с прогревом помещений)	20 дней	Пн 07.04.25	Пт 02.05.25		
119		7.20 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 07.07.25	Пт 01.08.25		
120		7.21 Лифты	21 дней	Пт 06.06.25	Пт 04.07.25		
121		7.22 Монтаж ИТП	24 дней	Вт 06.05.25	Пт 06.06.25		
122		7.23 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	24 дней	Вт 05.11.24	Пт 06.12.24		
123		7.24 Устройство наружных сетей теплоснабжения	23 дней	Ср 08.01.25	Пт 07.02.25		
124		7.25 Устройство наружных сетей электроснабжения (ПАО ЛенЭнерго)	23 дней	Ср 06.08.25	Пт 05.09.25		
125		7.26 Устройство наружных сетей связи	20 дней	Пн 06.10.25	Пт 31.10.25		
126		7.27 Устройство наружных сетей наружного освещения	20 дней	Пн 06.10.25	Пт 31.10.25		
127		7.28 Благоустройство (в т.ч. МГН)	20 дней	Пн 06.10.25	Пт 31.10.25		
128		**8 к.3, 4 Ю 35-9 (I этап)**	**82 дней**	**Пн 27.11.23**	**Пт 29.03.24**		
129		8.1 Общедомовой металл	29 дней	Пн 25.12.23	Пт 09.02.24		
130		8.2 Монтаж АСКУЭ	22 дней	Вт 20.02.24	Пт 22.03.24		
131		8.3 Монтаж ИТП	44 дней	Пн 27.11.23	Пт 02.02.24		
132		8.4 Устройство наружных сетей теплоснабжения	21 дней	Пт 26.01.24	Пт 23.02.24		
133		8.5 Устройство наружных сетей связи	24 дней	Пт 09.02.24	Пт 15.03.24		
134		8.6 Устройство наружных сетей наружного освещения	24 дней	Пт 09.02.24	Пт 15.03.24		
135		8.7 Благоустройство (в т.ч. МГН)	20 дней	Пт 01.03.24	Пт 29.03.24		
136		**9 к.5, 6 Ю 35-9 (II этап)**	**377 дней**	**Пн 01.07.24**	**Пт 19.12.25**		
137		9.1 Кладка стен внутренних и перегородок (в т.ч. ограждение переходных балконов)	30 дней	Пн 01.07.24	Пт 09.08.24		
138		9.2 Общедомовой металл	20 дней	Пн 11.11.24	Пт 06.12.24		
139		9.3 Кровля	19 дней	Пт 13.12.24	Пт 17.01.25		
140		9.4 Окна	22 дней	Чт 12.09.24	Пт 11.10.24		
141		9.5 Витражи	20 дней	Пн 20.01.25	Пт 14.02.25		
142		9.6 Монтаж АСКУЭ	20 дней	Пн 24.11.25	Пт 19.12.25		
143		9.7 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Пн 19.08.24	Пт 13.09.24		
144		9.8 Отделка, в т.ч. МГН (с прогревом помещений*)	20 дней	Пн 19.08.24	Пт 13.09.24		
145		9.9 Внутренние слаботочные системы и РАСЦО	20 дней	Пн 14.04.25	Пт 09.05.25		
146		9.10 Лифты	20 дней	Пт 25.10.24	Пт 22.11.24		
147		9.11 Монтаж ИТП	21 дней	Пт 20.09.24	Пт 18.10.24		

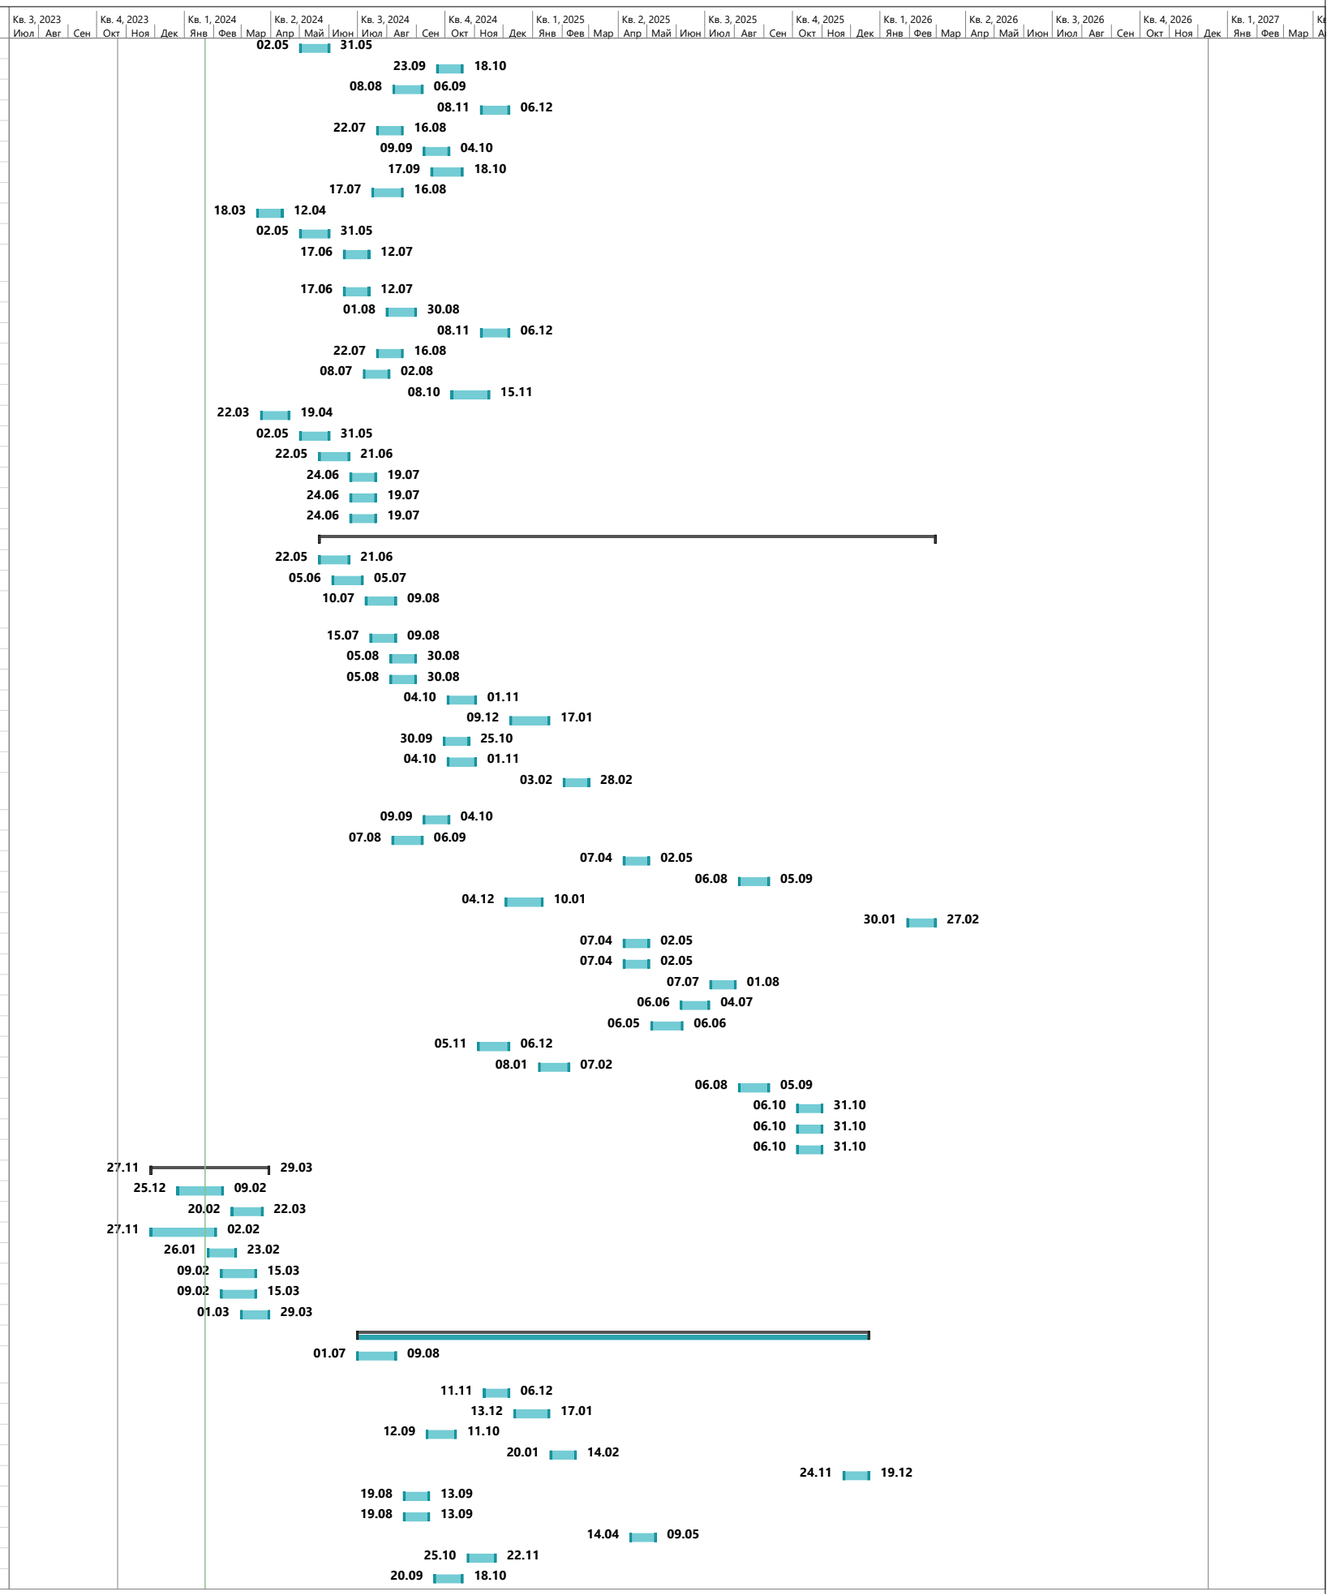

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов
148		9.12 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	20 дней	Пт 13.12.24	Пн 20.01.25		
149		9.13 Устройство наружных сетей связи	20 дней	Пн 13.10.25	Пт 07.11.25		
150		9.14 Устройство наружных сетей наружного освещения	20 дней	Пн 13.10.25	Пт 07.11.25		
151		9.15 Благоустройство (в т.ч. МГН)	20 дней	Пн 15.09.25	Пт 10.10.25		
152		**10 к.9, 10 Ю 34-7 (2.1 этап)**	**556 дней**	**Ср 01.05.24**	**Пт 03.07.26**		
153		10.1 Выторфовка и вертикальная планировка	21 дней	Ср 01.05.24	Пт 31.05.24		
154		10.2 Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	24 дней	Пн 03.06.24	Пт 05.07.24		
155		10.3 Геодезическая разбивочная основа	24 дней	Пн 03.06.24	Пт 05.07.24		
156		10.4 Временное энергоснабжение площадки	22 дней	Чт 01.08.24	Пт 30.08.24		
157		10.5 Сваи	22 дней	Чт 01.08.24	Пт 30.08.24		
158		10.6 Откопка котлована	19 дней	Вт 01.10.24	Пт 25.10.24		
159		10.7 Фундамент (6 326 м3)	19 дней	Вт 01.10.24	Пт 25.10.24		
160		10.8 Прифундаментный дренаж	21 дней	Чт 17.10.24	Пт 15.11.24		
161		10.9 Монтаж БК	20 дней	Пн 02.09.24	Пт 27.09.24		
162		10.10 Монолитный каркас (75 м)	20 дней	Пн 07.10.24	Пт 01.11.24		
163		10.11 Кладка стен внутренних и перегородок (в т.ч. ограждение переходных балконов)	21 дней	Чт 17.10.24	Пт 15.11.24		
164		10.12 Общедомовой металл	20 дней	Пн 07.07.25	Пт 01.08.25		
165		10.13 Кровля	20 дней	Пн 14.07.25	Пт 08.08.25		
166		10.14 Окна	20 дней	Пн 10.03.25	Пт 04.04.25		
167		10.15 Витражи	20 дней	Пн 14.07.25	Пт 08.08.25		
168		10.16 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 04.11.24	Пт 29.11.24		
169		10.17 Монтаж АСКУЭ	20 дней	Пн 08.06.26	Пт 03.07.26		
170		10.18 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Пн 10.03.25	Пт 04.04.25		
171		10.19 Отделка, в т.ч. МГН (с прогревом помещений)	20 дней	Пн 10.03.25	Пт 04.04.25		
172		10.20 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 16.06.25	Пт 11.07.25		
173		10.21 Лифты	20 дней	Пн 12.05.25	Пт 06.06.25		
174		10.22 Монтаж ИТП	20 дней	Пн 17.03.25	Пт 11.04.25		
175		10.23 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	24 дней	Пн 14.10.24	Пт 15.11.24		
176		10.24 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пн 02.12.24	Пт 27.12.24		
177		10.25 Устройство наружных сетей связи	20 дней	Пн 12.01.26	Пт 06.02.26		
178		10.26 Устройство наружных сетей наружного освещения	20 дней	Пн 12.01.26	Пт 06.02.26		
179		10.27 Благоустройство (в т.ч. МГН)	20 дней	Пн 12.01.26	Пт 06.02.26		
180		**11 к.7, 8 Ю 34-7 (2.2 этап)**	**522 дней**	**Пн 04.11.24**	**Пт 13.11.26**		
181		11.1 Снос зелёных насаждений	20 дней	Пн 04.11.24	Пт 29.11.24		
182		11.2 Выторфовка и вертикальная планировка	23 дней	Пн 16.12.24	Пт 24.01.25		
183		11.3 Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	20 дней	Пн 03.03.25	Пт 28.03.25		
184		11.4 Геодезическая разбивочная основа	20 дней	Пн 03.02.25	Пт 28.02.25		
185		11.5 Временное энергоснабжение площадки	20 дней	Пн 14.04.25	Пт 09.05.25		
186		11.6 Сваи	20 дней	Пн 14.04.25	Пт 09.05.25		
187		11.7 Откопка котлована	20 дней	Пн 09.06.25	Пт 04.07.25		
188		11.8 Прифундаментный дренаж	20 дней	Пн 11.08.25	Пт 05.09.25		
189		11.9 Монтаж БК	20 дней	Пн 09.06.25	Пт 04.07.25		
190		11.10 Монолитный каркас (75 м)	24 дней	Вт 01.07.25	Пт 01.08.25		
191		11.11 Кладка стен внутренних и перегородок (в т.ч. ограждение переходных балконов)	20 дней	Пн 13.10.25	Пт 07.11.25		
192		11.12 Общедомовой металл	20 дней	Пн 11.05.26	Пт 05.06.26		
193		11.13 Кровля	20 дней	Пн 13.04.26	Пт 08.05.26		
194		11.14 Окна	20 дней	Пн 01.12.25	Пт 26.12.25		
195		11.15 Витражи	20 дней	Пн 13.04.26	Пт 08.05.26		
196		11.16 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 18.08.25	Пт 12.09.25		
197		11.17 Монтаж АСКУЭ	20 дней	Пн 19.10.26	Пт 13.11.26		
198		11.18 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Пн 01.12.25	Пт 26.12.25		
199		11.19 Отделка, в т.ч. МГН	20 дней	Пн 01.12.25	Пт 26.12.25		
200		11.20 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 16.03.26	Пт 10.04.26		
201		11.21 Лифты	20 дней	Пн 16.02.26	Пт 13.03.26		
202		11.22 Монтаж ИТП	20 дней	Пн 12.01.26	Пт 06.02.26		
203		11.23 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	20 дней	Пн 11.08.25	Пт 05.09.25		
204		11.24 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пн 15.09.25	Пт 10.10.25		
205		11.25 Устройство наружных сетей электроснабжения (ПАО ЛенЭнерго)	20 дней	Пн 16.02.26	Пт 13.03.26		
206		11.26 Устройство наружных сетей связи	20 дней	Пн 13.04.26	Пт 08.05.26		
207		11.27 Устройство наружных сетей наружного освещения	20 дней	Пн 13.04.26	Пт 08.05.26		
208		11.28 Благоустройство (в т.ч. МГН)	20 дней	Пн 13.04.26	Пт 08.05.26		
209		**12 к.1-5 Ю 34-7 (3 этап)**	**520 дней**	**Чт 05.12.24**	**Пт 11.12.26**		
210		12.1 Снос зелёных насаждений	20 дней	Чт 05.12.24	Пт 10.01.25		
211		12.2 Выторфовка и вертикальная планировка	23 дней	Ср 05.02.25	Пт 07.03.25		
212		12.3 Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	31 дней	Сб 05.04.25	Пт 16.05.25		
213		12.4 Геодезическая разбивочная основа	23 дней	Ср 05.03.25	Пт 04.04.25		
214		12.5 Временное энергоснабжение площадки	22 дней	Чт 15.05.25	Пт 13.06.25		
215		12.6 Сваи	22 дней	Чт 15.05.25	Пт 13.06.25		
216		12.7 Откопка котлована	24 дней	Вт 15.07.25	Пт 15.08.25		
217		12.8 Прифундаментный дренаж	20 дней	Пн 15.09.25	Пт 10.10.25		
218		12.9 Монтаж БК	24 дней	Вт 15.07.25	Пт 15.08.25		
219		12.10 Монолитный каркас (75 м)	24 дней	Вт 05.08.25	Пт 05.09.25		

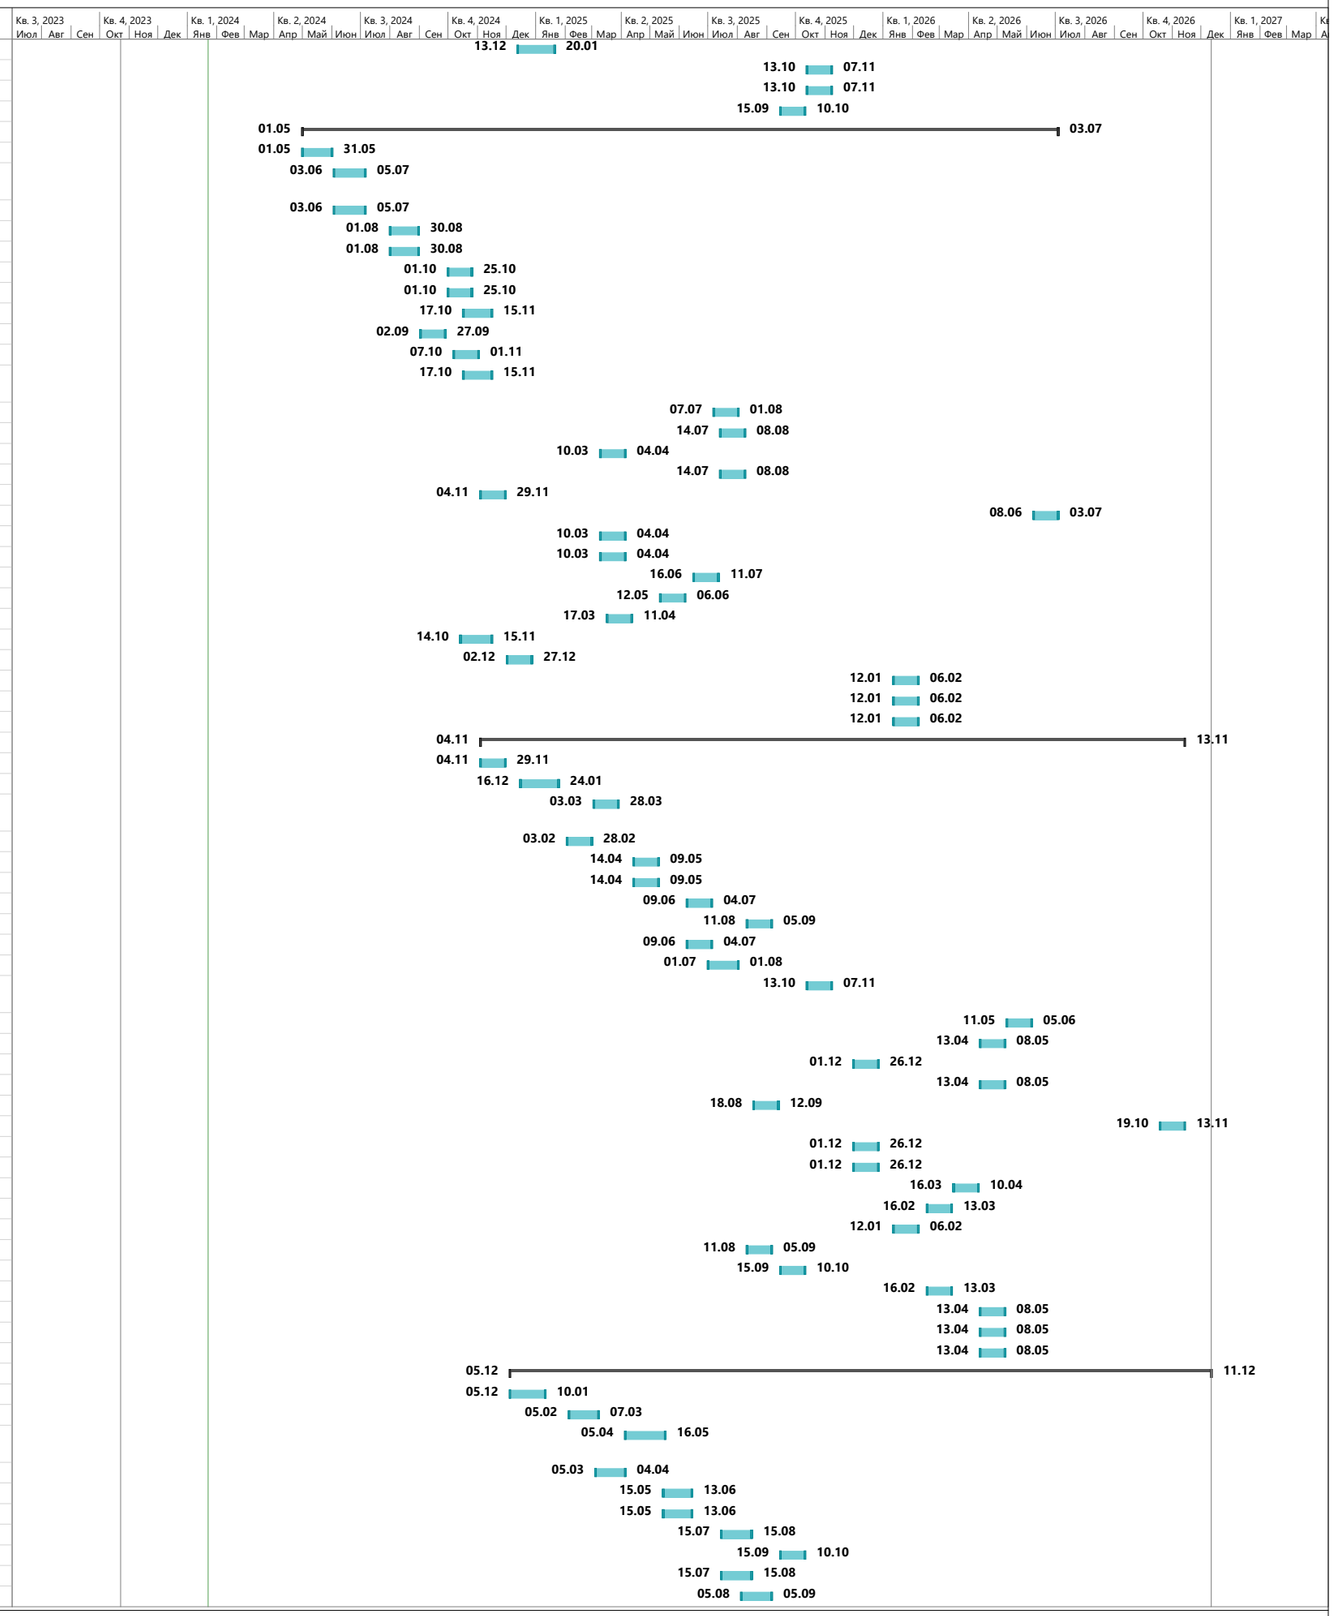

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов
220		12.11 Кладка стен внутренних и перегородок (в т.ч. ограждение переходных балконов)	21 дней	Сб 15.11.25	Пт 12.12.25		
221		12.12 Общедомовой металл	20 дней	Пн 15.06.26	Пт 10.07.26		
222		12.13 Кровля	21 дней	Пт 15.05.26	Пт 12.06.26		
223		12.14 Окна	22 дней	Чт 15.01.26	Пт 13.02.26		
224		12.15 Витражи	21 дней	Пт 15.05.26	Пт 12.06.26		
225		12.16 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пн 15.09.25	Пт 10.10.25		
226		12.17 Монтаж АСКУЭ	21 дней	Вс 15.11.26	Пт 11.12.26		
227		12.18 Внутренние сантехнические системы	21 дней	Сб 10.01.26	Пт 06.02.26		
228		12.19 Отделка, в т.ч. МГН	21 дней	Сб 10.01.26	Пт 06.02.26		
229		12.20 Внутренние слаботочные сети	23 дней	Ср 15.04.26	Пт 15.05.26		
230		12.21 Лифты	21 дней	Вс 15.03.26	Пт 10.04.26		
231		12.22 Монтаж ИТП	21 дней	Вс 15.02.26	Пт 13.03.26		
232		12.23 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	21 дней	Пт 15.08.25	Пт 12.09.25		
233		12.24 Устройство наружных сетей теплоснабжения	23 дней	Ср 15.10.25	Пт 14.11.25		
234		12.25 Устройство наружных сетей электроснабжения (ПАО ЛенЭнерго)	21 дней	Вс 15.03.26	Пт 10.04.26		
235		12.26 Устройство наружных сетей связи	21 дней	Пт 15.05.26	Пт 12.06.26		
236		12.27 Устройство наружных сетей наружного освещения	21 дней	Пт 15.05.26	Пт 12.06.26		
237		12.28 Благоустройство (в т.ч. МГН)	21 дней	Пт 15.05.26	Пт 12.06.26		
238		**13 паркинг к.11 Ю 34-7**	**443 дней**	**Пт 05.07.24**	**Пт 27.03.26**		
239		13.1 Выторфовка и вертикальная планировка	26 дней	Пт 05.07.24	Пт 09.08.24		
240		13.2 Временные дороги	20 дней	Пн 05.08.24	Пт 30.08.24		
241		13.3 Временное энергоснабжение площадки	20 дней	Пн 05.08.24	Пт 30.08.24		
242		13.4 Сваи	22 дней	Чт 05.09.24	Пт 04.10.24		
243		13.5 Откопка котлована	21 дней	Пт 04.10.24	Пт 01.11.24		
244		13.6 Фундамент	20 дней	Пн 11.11.24	Пт 06.12.24		
245		13.7 Прифундаментный дренаж	23 дней	Ср 15.01.25	Пт 14.02.25		
246		13.8 Монолитный каркас	24 дней	Вт 05.11.24	Пт 06.12.24		
247		13.9 Монтаж БК	22 дней	Ср 30.10.24	Пт 29.11.24		
248		13.10 Фасады (навесной фасад из металлокаркаса и профлиста, вентилируемый фасад)	20 дней	Пн 07.07.25	Пт 01.08.25		
249		13.11 Кладка стен внутренних и перегородок	22 дней	Чт 06.03.25	Пт 04.04.25		
250		13.12 Общедомой металл	21 дней	Пт 06.06.25	Пт 04.07.25		
251		13.13 Кровля	20 дней	Пн 07.07.25	Пт 01.08.25		
252		13.14 Окна	20 дней	Пн 07.07.25	Пт 01.08.25		
253		13.15 Внутренние электромонтажные работы	21 дней	Ср 04.12.24	Пт 10.01.25		
254		13.16 Монтаж АСКУЭ	24 дней	Вт 24.02.26	Пт 27.03.26		
255		13.17 Отделка (помещения 1-го этажа, лестничные клетки, полы) с локальным прогревом	21 дней	Пт 01.08.25	Пт 29.08.25		
256		13.18 Внутренние сантехнические системы	21 дней	Пт 01.08.25	Пт 29.08.25		
257		13.19 Вертикальный транспорт	22 дней	Чт 01.05.25	Пт 30.05.25		
258		13.20 Устройство ворот	20 дней	Пн 24.11.25	Пт 19.12.25		
259		13.21 Внутренние слаботочные сети	22 дней	Чт 11.09.25	Пт 10.10.25		
260		13.22 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	21 дней	Ср 04.12.24	Пт 10.01.25		
261		13.23 Устройство наружных сетей электроснабжения	22 дней	Чт 09.01.25	Пт 07.02.25		
262		13.24 Устройство наружных сетей наружного освещения	23 дней	Ср 06.08.25	Пт 05.09.25		
263		13.25 Устройство наружных сетей связи	23 дней	Ср 06.08.25	Пт 05.09.25		
264		13.26 Благоустройство (в т.ч. МГН)	23 дней	Ср 06.08.25	Пт 05.09.25		
265		**14 гипермаркет Ю 1-5**	**217 дней**	**Пн 15.07.24**	**Пт 23.05.25**		
266		14.1 Снос зеленых насаждений	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
267		14.2 Выторфовка, вертикальная планировка, временные дороги	21 дней	Сб 20.07.24	Пт 16.08.24		
268		14.3 Временное энергоснабжение площадки	21 дней	Сб 10.08.24	Пт 06.09.24		
269		14.4 Откопка котлована	21 дней	Сб 10.08.24	Пт 06.09.24		
270		14.5 Фундамент	21 дней	Вс 25.08.24	Пт 20.09.24		
271		14.6 Прифундаментный дренаж	20 дней	Пн 20.01.25	Пт 14.02.25		
272		14.7 Монолитный каркас (14 м)	21 дней	Вс 25.08.24	Пт 20.09.24		
273		14.8 Монтаж БК	21 дней	Вс 25.08.24	Пт 20.09.24		
274		14.9 Фасады (навесной фасад из сендвичпанелей и фасадных кассет)	20 дней	Пн 20.01.25	Пт 14.02.25		
275		14.10 Кладка стен внутренних и перегородок	20 дней	Вс 20.10.24	Пт 15.11.24		
276		14.11 Общедомовой металл	20 дней	Пн 20.01.25	Пт 14.02.25		
277		14.12 Кровля	24 дней	Вс 15.12.24	Пт 24.01.25		
278		14.13 Окна	24 дней	Вс 15.12.24	Пт 24.01.25		
279		14.14 Витражи	21 дней	Ср 25.12.24	Пт 31.01.25		
280		14.15 Внутренние электромонтажные работы	21 дней	Пт 20.09.24	Пт 18.10.24		
281		14.16 Монтаж АСКУЭ	21 дней	Пт 25.04.25	Пт 23.05.25		
282		14.17 Отделка (в т.ч. МГН) с прогревом помещений	22 дней	Вт 10.12.24	Пт 17.01.25		
283		14.18 Внутренние сантехнические системы	22 дней	Вт 10.12.24	Пт 17.01.25		
284		14.19 Лифты и эскалаторы	20 дней	Пт 01.11.24	Пт 29.11.24		
285		14.20 Монтаж ИТП	23 дней	Пн 16.12.24	Пт 24.01.25		
286		14.21 Внутренние слаботочные сети	20 дней	Пн 20.01.25	Пт 14.02.25		
287		14.22 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	21 дней	Пт 20.09.24	Пт 18.10.24		
288		14.23 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пт 25.10.24	Пт 22.11.24		
289		14.24 Устройство наружных сетей электроснабжения	20 дней	Пн 25.11.24	Пт 20.12.24		
290		14.25 Устройство наружных сетей связи	21 дней	Пт 25.04.25	Пт 23.05.25		
291		14.26 Устройство наружных сетей наружного освещения	21 дней	Пт 25.04.25	Пт 23.05.25		
292		14.27 Благоустройство (в т.ч. МГН)	21 дней	Пт 25.04.25	Пт 23.05.25		

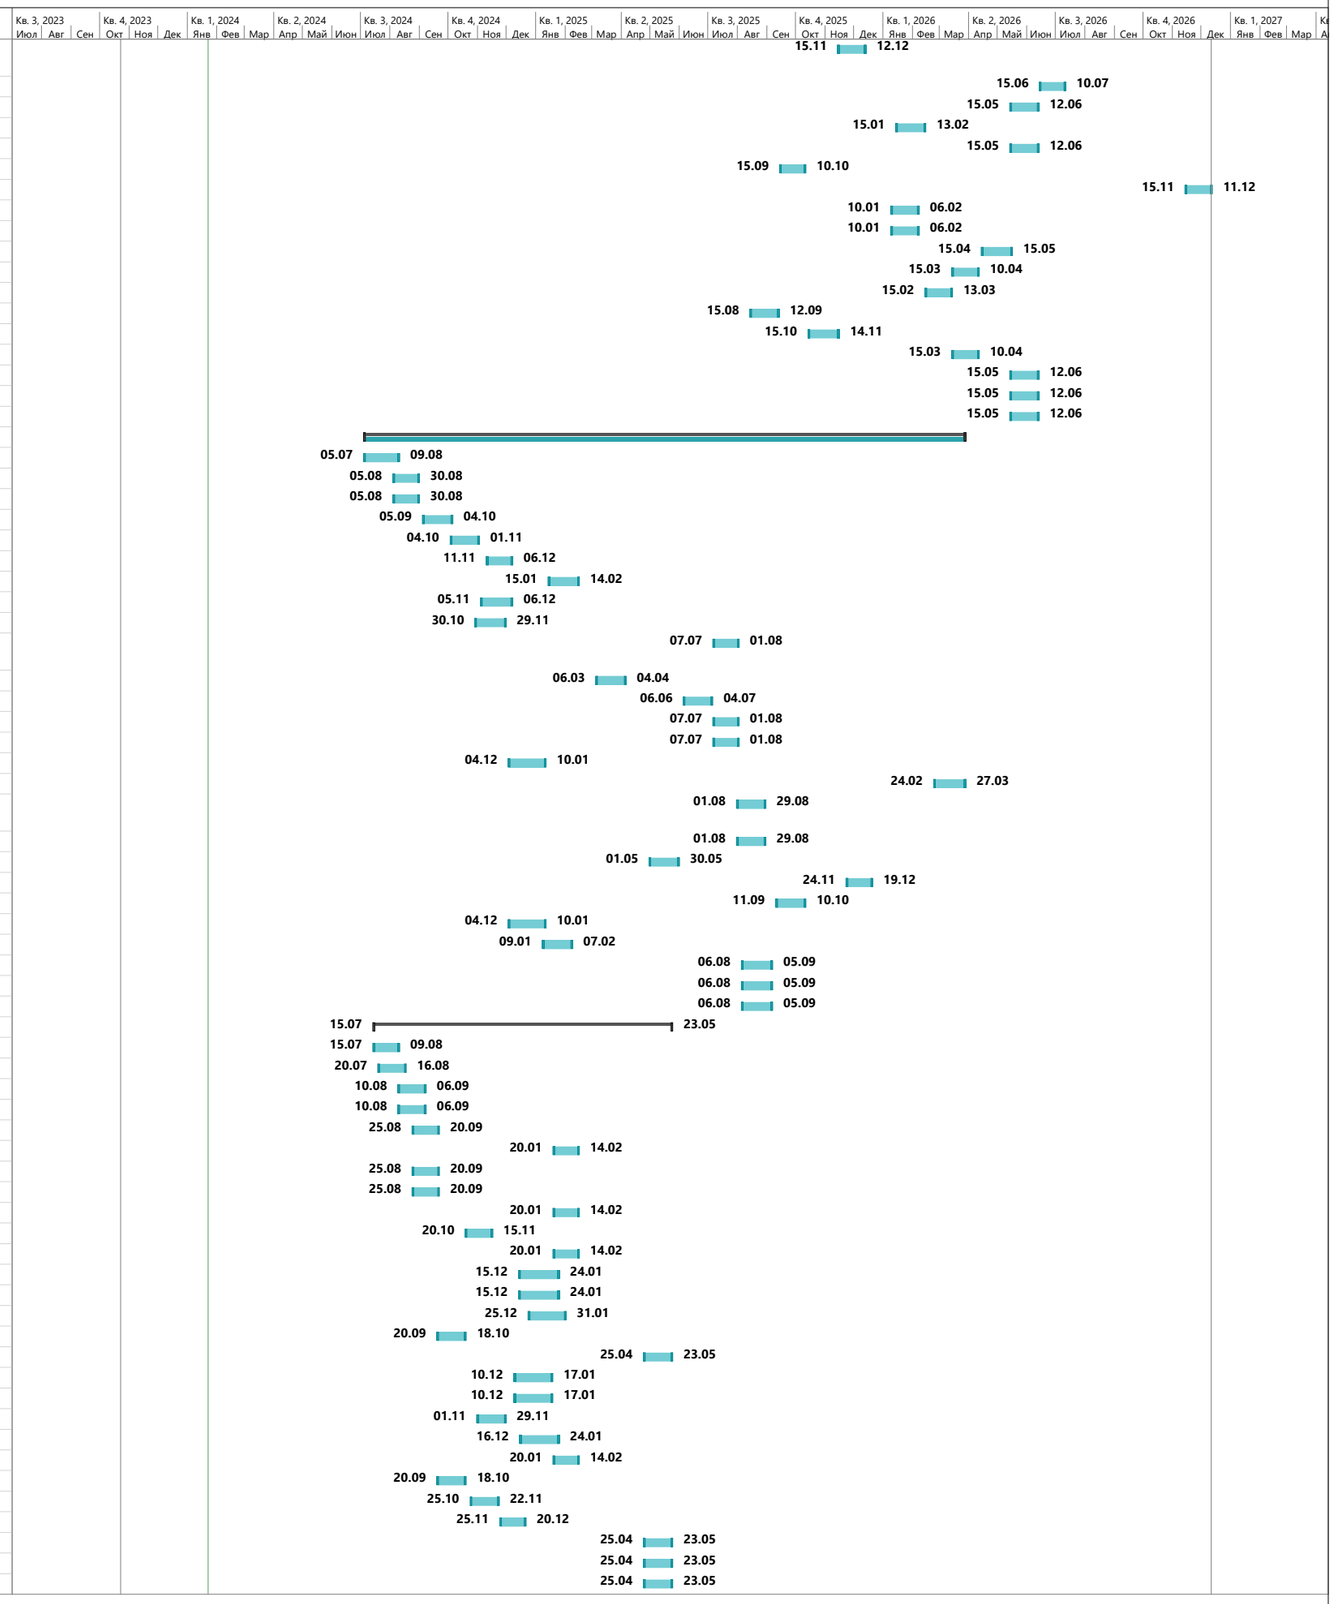

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов
293		**15 ДОУ на 280 мест Ю 34-7**	**294 дней**	**Пн 22.01.24**	**Пт 28.03.25**		
294		15.1 Временное энергоснабжение площадки	25 дней	Пн 29.01.24	Пн 04.03.24		
295		15.2 Откопка котлована	24 дней	Пн 05.02.24	Пт 08.03.24		
296		15.3 Прифундаментный дренаж	26 дней	Пт 19.04.24	Пт 31.05.24		
297		15.4 Устройство свайного основания	20 дней	Пн 22.01.24	Пт 16.02.24		
298		15.5 Монолитный каркас	26 дней	Пн 01.04.24	Пт 10.05.24		
299		15.6 Монтаж БК	26 дней	Пн 01.04.24	Пт 10.05.24		
300		15.7 Кладка стен внутренних и перегородок	26 дней	Ср 01.05.24	Пт 07.06.24		
301		15.8 Кровля	21 дней	Пт 14.06.24	Пт 12.07.24		
302		15.9 Фасады	21 дней	Пт 14.06.24	Пт 12.07.24		
303		15.10 Витражи	21 дней	Пт 14.06.24	Пт 12.07.24		
304		15.11 Металлоконструкции	21 дней	Сб 20.04.24	Пт 24.05.24		
305		15.12 Внутренние электромонтажные работы	26 дней	Пн 01.04.24	Пт 10.05.24		
306		15.13 Монтаж АСКУЭ	21 дней	Сб 01.03.25	Пт 28.03.25		
307		15.14 Внутренние сантехнические системы	21 дней	Пт 19.07.24	Пт 16.08.24		
308		15.15 Отделка черновая (в т.ч. спец.помещения) с локальным прогревом	21 дней	Пт 19.07.24	Пт 16.08.24		
309		15.16 Отделка чистовая, в т.ч МГН (с локальным прогревом)	21 дней	Пт 19.07.24	Пт 16.08.24		
310		15.17 Вертикальный транспорт	21 дней	Пт 19.07.24	Пт 16.08.24		
311		15.18 Оборотная система водоподготовки бассейнов	21 дней	Пт 19.07.24	Пт 16.08.24		
312		15.19 Внутренние слаботочные сети	26 дней	Ср 01.05.24	Пт 07.06.24		
313		15.20 ИТП	21 дней	Чт 23.05.24	Пт 21.06.24		
314		15.21 Монтируемое оборудование	22 дней	Вт 10.12.24	Пт 17.01.25		
315		15.22 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	21 дней	Пн 08.04.24	Пт 10.05.24		
316		15.23 Устройство наружных сетей теплоснабжения	21 дней	Пн 08.04.24	Пт 10.05.24		
317		15.24 Устройство наружных сетей электроснабжения	19 дней	Вс 15.12.24	Пт 17.01.25		
318		15.25 Устройство наружных сетей связи	19 дней	Вс 15.12.24	Пт 17.01.25		
319		15.26 Устройство наружных сетей наружного освещения	19 дней	Вс 15.12.24	Пт 17.01.25		
320		15.27 Благоустройство, в т.ч. МГН	19 дней	Вс 15.12.24	Пт 17.01.25		
321		**16 Центральный парк Ю 35-9 (1 этап)**	**197 дней**	**Пн 15.07.24**	**Пт 25.04.25**		
322		16.1 Твердые покрытия	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
323		16.2 Озеленение	21 дней	Сб 15.02.25	Пт 14.03.25		
324		16.3 Устройство канализации	22 дней	Чт 15.08.24	Пт 13.09.24		
325		16.4 Устройство МАФ	24 дней	Вт 25.03.25	Пт 25.04.25		
326		16.5 Наружное освещение	22 дней	Чт 15.08.24	Пт 13.09.24		
327		**17 к.7-9 Ю 35-9 (2 этап)**	**498 дней**	**Вт 09.01.24**	**Пт 26.12.25**		
328		17.1 Подготовительные работы (перенос штаба)	25 дней	Пн 15.01.24	Пт 16.02.24		
329		17.2 Сваи	24 дней	Вт 09.01.24	Пт 09.02.24		
330		17.3 Откопка котлована	20 дней	Пн 29.01.24	Пт 23.02.24		
331		17.4 Прифундаментный дренаж	12 дней	Сб 20.04.24	Пт 10.05.24		
332		17.5 Монтаж БК	24 дней	Пн 05.02.24	Пт 08.03.24		
333		17.6 Монолитный каркас (75 м)	24 дней	Пн 05.02.24	Пт 08.03.24		
334		17.7 Кладка стен внутренних и перегородок (в т.ч. ограждение переходных балконов)	21 дней	Сб 15.06.24	Пт 12.07.24		
335		17.8 Общедомовой металл	23 дней	Вт 15.10.24	Пт 15.11.24		
336		17.9 Кровля	23 дней	Ср 20.11.24	Пт 20.12.24		
337		17.10 Окна	24 дней	Вт 20.08.24	Пт 20.09.24		
338		17.11 Витражи	19 дней	Пт 20.12.24	Пт 24.01.25		
339		17.12 Внутренние электромонтажные работы	21 дней	Сб 20.04.24	Пт 24.05.24		
340		17.13 Монтаж АСКУЭ	20 дней	Пн 01.12.25	Пт 26.12.25		
341		17.14 Внутренние сантехнические системы	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
342		17.15 Отделка, в т.ч. МГН (с прогревом помещений*)	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
343		17.16 Внутренние слаботочные сети	21 дней	Вс 15.09.24	Пт 11.10.24		
344		17.17 Лифты	21 дней	Сб 05.10.24	Пт 01.11.24		
345		17.18 Монтаж ИТП	22 дней	Чт 01.08.24	Пт 30.08.24		
346		17.19 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	22 дней	Вт 20.02.24	Пт 22.03.24		
347		17.20 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
348		17.21 Устройство наружных сетей связи	21 дней	Сб 15.02.25	Пт 14.03.25		
349		17.22 Устройство наружных сетей наружного освещения	21 дней	Сб 15.02.25	Пт 14.03.25		
350		17.23 Благоустройство (в т.ч. МГН)	21 дней	Сб 15.02.25	Пт 14.03.25		
351		**18 ТОП Ю 35-9 (Гринфингер)**	**23 дней**	**Ср 10.04.24**	**Пт 17.05.24**		
352		18.1 Устройство МАФ	23 дней	Ср 10.04.24	Пт 17.05.24		
353		18.2 Наружное освещение	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
354		**19 ТОП Ю 32-19 (Гринфингер)**	**197 дней**	**Сб 15.06.24**	**Пт 28.03.25**		
355		19.1 Твердые покрытия	21 дней	Сб 15.06.24	Пт 12.07.24		
356		19.2 Озеленение	21 дней	Сб 15.02.25	Пт 14.03.25		
357		19.3 Устройство канализации	20 дней	Пн 15.07.24	Пт 09.08.24		
358		19.4 Устройство МАФ	24 дней	Вт 25.02.25	Пт 28.03.25		
359		19.5 Наружное освещение	23 дней	Ср 10.07.24	Пт 09.08.24		
360		**20 магистраль М1 Ю**	**20 дней**	**Пн 01.04.24**	**Пт 26.04.24**		
361		20.1 Полный комплекс работ	20 дней	Пн 01.04.24	Пт 26.04.24		
362		**21 магистраль М2 Ю**	**22 дней**	**Чт 01.08.24**	**Пт 30.08.24**		
363		21.1 Полный комплекс работ	22 дней	Чт 01.08.24	Пт 30.08.24		
364		**22 магистраль М5 Ю 34-7**	**20 дней**	**Пн 01.04.24**	**Пт 26.04.24**		
365		22.1 Полный комплекс работ	20 дней	Пн 01.04.24	Пт 26.04.24		
366		**23 магистраль М5 Ю 32-21**	**20 дней**	**Пн 01.04.24**	**Пт 26.04.24**		

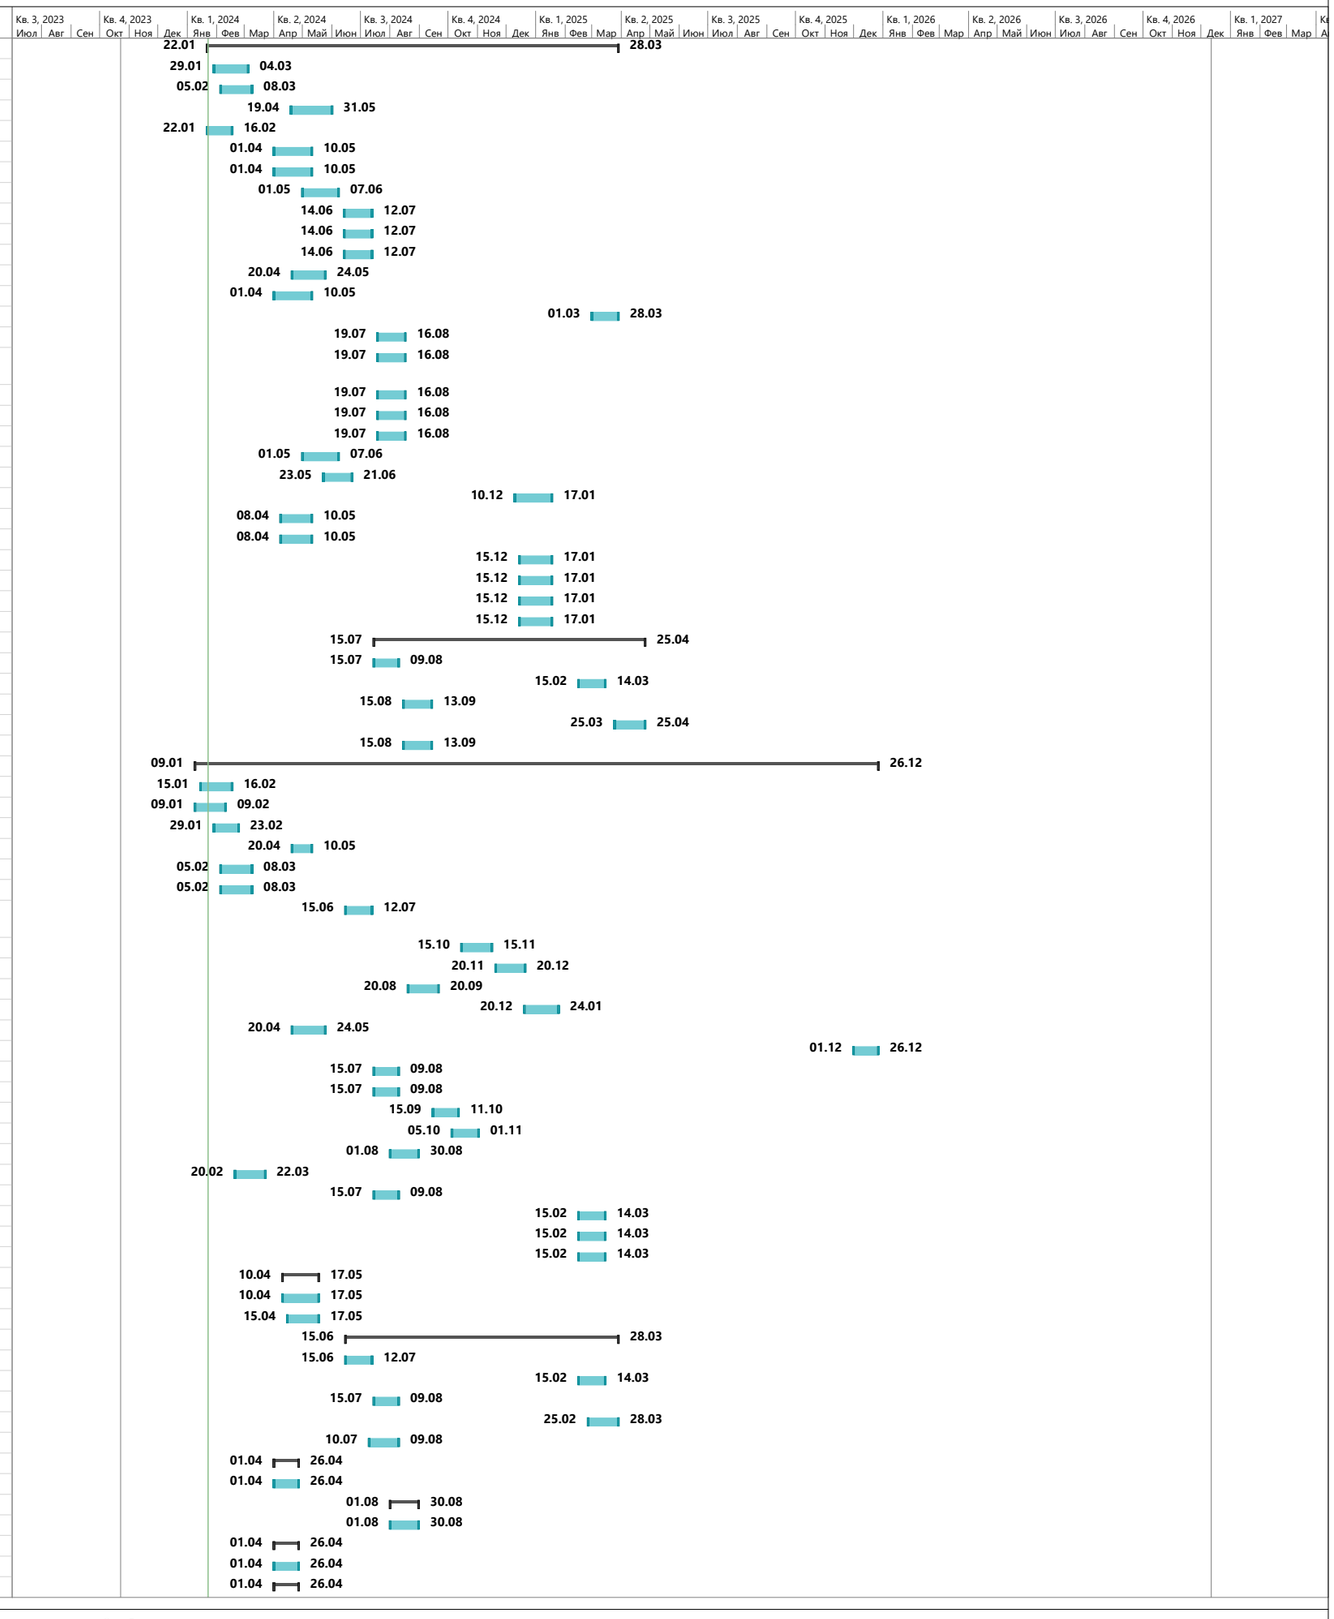

График проведения тендеров для объектов строительства ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово"
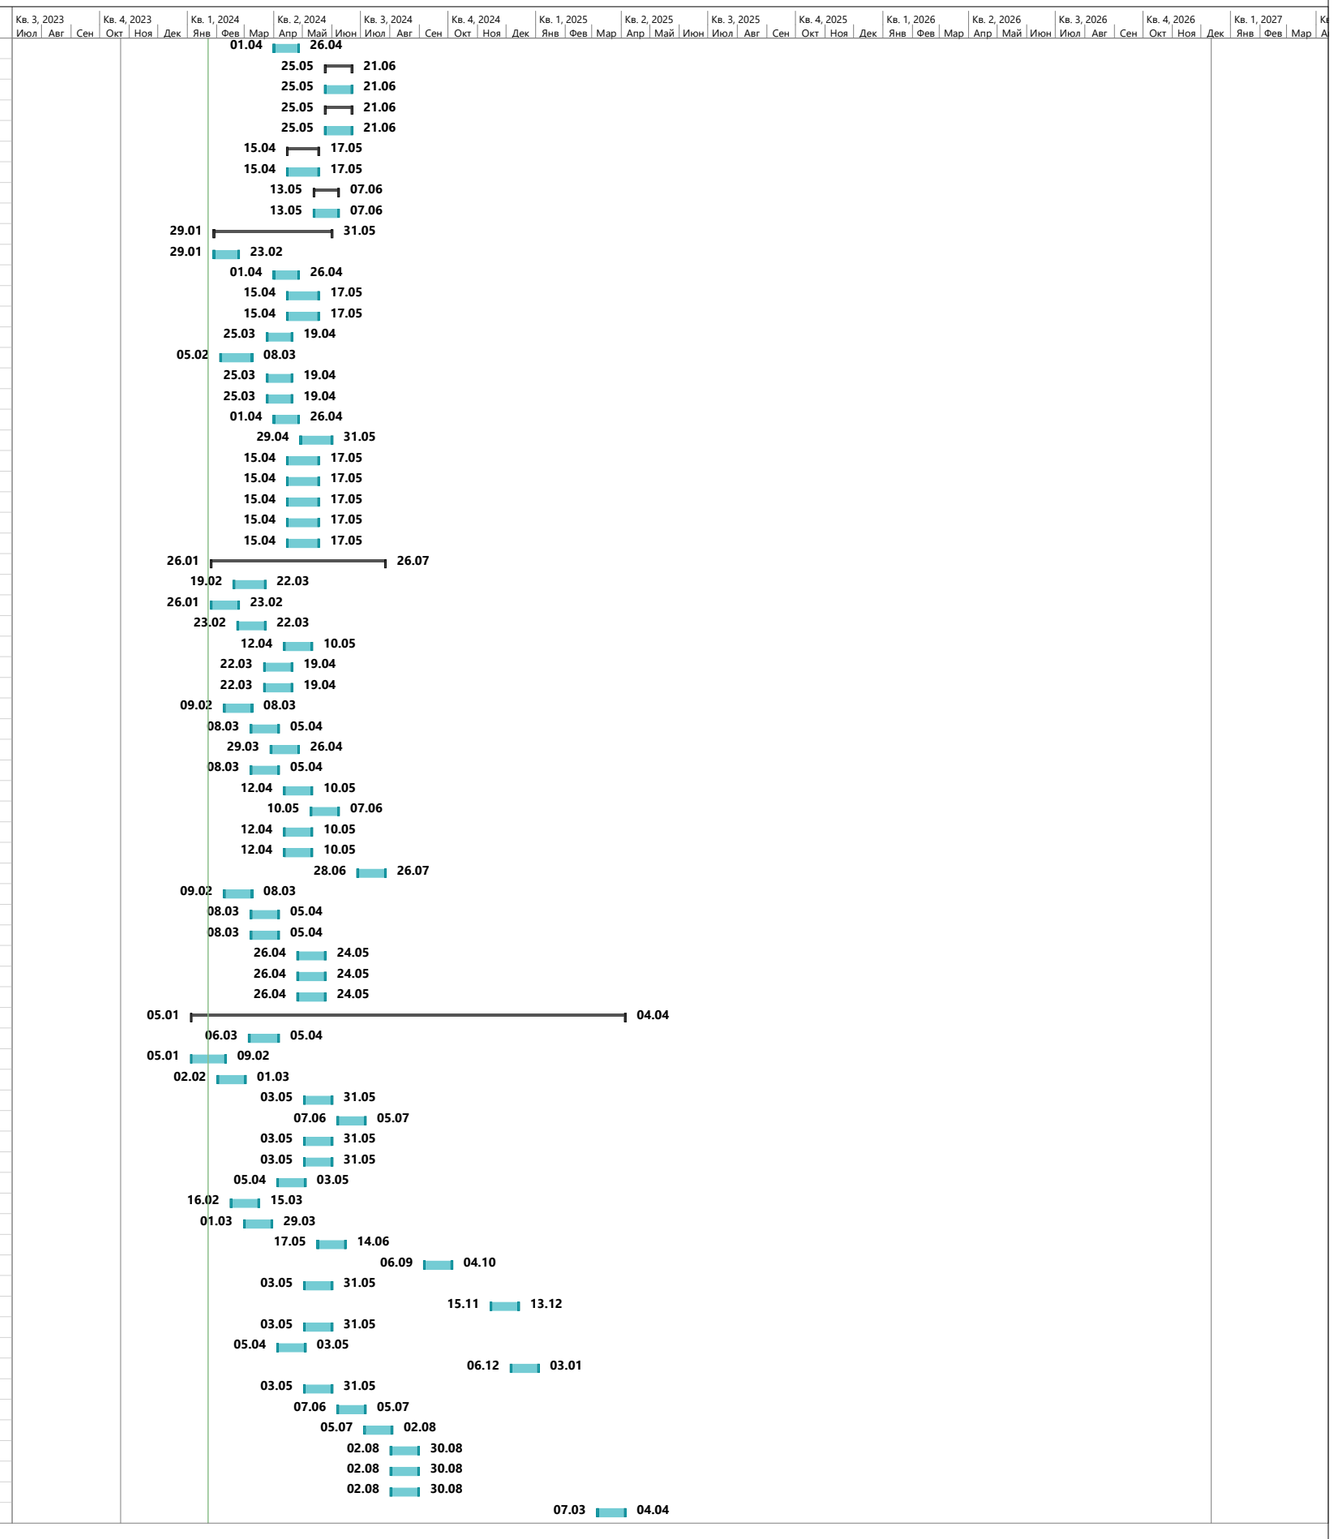
Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов
367		23.1 Полный комплекс работ	20 дней	Пн 01.04.24	Пт 26.04.24		
368		**24 магистраль М6 Ю 35-9**	**19 дней**	**Сб 25.05.24**	**Пт 21.06.24**		
369		24.1 Полный комплекс работ	20 дней	Сб 25.05.24	Пт 21.06.24		
370		**25 проезд 10 Ю 30-22**	**19 дней**	**Сб 25.05.24**	**Пт 21.06.24**		
371		25.1 Полный комплекс работ	20 дней	Сб 25.05.24	Пт 21.06.24		
372		**26 проезд 13 Ю 9-15**	**20 дней**	**Пн 15.04.24**	**Пт 17.05.24**		
373		26.1 Полный комплекс работ	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
374		**27 проезды 13, 14 Ю 31-18**	**20 дней**	**Пн 13.05.24**	**Пт 07.06.24**		
375		27.1 Полный комплекс работ	20 дней	Пн 13.05.24	Пт 07.06.24		
376		**28 ЮН квартал 35-9 (этап 1.2) корпус №10 (паркинг)**	**83 дней**	**Пн 29.01.24**	**Пт 31.05.24**		
377		28.1 Каменная кладка	20 дней	Пн 29.01.24	Пт 23.02.24		
378		28.2 Фасады	20 дней	Пн 01.04.24	Пт 26.04.24		
379		28.3 Общедомовой металл	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
380		28.4 Окна	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
381		28.5 Кровля	20 дней	Пн 25.03.24	Пт 19.04.24		
382		28.6 Внутренние электромонтажные работы	24 дней	Пн 05.02.24	Пт 08.03.24		
383		28.7 Внутренние сантехнические работы	20 дней	Пн 25.03.24	Пт 19.04.24		
384		28.8 Отделка, в т.ч. МГН	20 дней	Пн 25.03.24	Пт 19.04.24		
385		28.9 Лифты	20 дней	Пн 01.04.24	Пт 26.04.24		
386		28.10 Ворота	21 дней	Пн 29.04.24	Пт 31.05.24		
387		28.11 Слаботочные системы и РАСЦО	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
388		28.12 НВК	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
389		28.13 НЭС	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
390		28.14 НСС	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
391		28.15 Благоустройство (в т.ч. МГН)	20 дней	Пн 15.04.24	Пт 17.05.24		
392		**29 ЮН ДОО на 200 мест. ЖК "Юнтолово", квартал 35, корпус 1.**	**123 дней**	**Пт 26.01.24**	**Пт 26.07.24**		
393		29.1 Прифундаментный дренаж	23 дней	Пн 19.02.24	Пт 22.03.24		
394		29.2 Каменная кладка	21 дней	Пт 26.01.24	Пт 23.02.24		
395		29.3 Фасады	20 дней	Пт 23.02.24	Пт 22.03.24		
396		29.4 Витражи	17 дней	Пт 12.04.24	Пт 10.05.24		
397		29.5 Металлоконструкции	21 дней	Пт 22.03.24	Пт 19.04.24		
398		29.6 Окна	21 дней	Пт 22.03.24	Пт 19.04.24		
399		29.7 Внутренние электромонтажные работы	20 дней	Пт 09.02.24	Пт 08.03.24		
400		29.8 Внутренние сантехнические работы	21 дней	Пт 08.03.24	Пт 05.04.24		
401		29.9 Отделка (с прогревом помещений), в т.ч МГН	21 дней	Пт 29.03.24	Пт 26.04.24		
402		29.10 Кровля	21 дней	Пт 08.03.24	Пт 05.04.24		
403		29.11 Вертикальный транспорт	17 дней	Пт 12.04.24	Пт 10.05.24		
404		29.12 Монтаж оборудования для водоподготовки бассейна	21 дней	Пт 10.05.24	Пт 07.06.24		
405		29.13 Слаботочные системы	17 дней	Пт 12.04.24	Пт 10.05.24		
406		29.14 ИТП	17 дней	Пт 12.04.24	Пт 10.05.24		
407		29.15 Монтируемое оборудование	21 дней	Пт 28.06.24	Пт 26.07.24		
408		29.16 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	20 дней	Пт 09.02.24	Пт 08.03.24		
409		29.17 Устройство наружных сетей теплоснабжения	21 дней	Пт 08.03.24	Пт 05.04.24		
410		29.18 Устройство наружных сетей электроснабжения	21 дней	Пт 08.03.24	Пт 05.04.24		
411		29.19 Устройство наружных сетей связи	16 дней	Пт 26.04.24	Пт 24.05.24		
412		29.20 Устройство наружных сетей наружного освещения	16 дней	Пт 26.04.24	Пт 24.05.24		
413		29.21 Благоустройство, в т.ч. МГН	16 дней	Пт 26.04.24	Пт 24.05.24		
414		**30 Поликлиника. ЖК "Юнтолово", квартал 35, корпус 2**	**308 дней**	**Пт 05.01.24**	**Пт 04.04.25**		
415		30.1 Прифундаментный дренаж	22 дней	Ср 06.03.24	Пт 05.04.24		
416		30.2 Монтаж БК (2 шт.)	25 дней	Пт 05.01.24	Пт 09.02.24		
417		30.3 Каменная кладка	20 дней	Пт 02.02.24	Пт 01.03.24		
418		30.4 Устройство фасадов	19 дней	Пт 03.05.24	Пт 31.05.24		
419		30.5 Металлоконструкции (общедомой)	20 дней	Пт 07.06.24	Пт 05.07.24		
420		30.6 Витражи	19 дней	Пт 03.05.24	Пт 31.05.24		
421		30.7 Кровля	19 дней	Пт 03.05.24	Пт 31.05.24		
422		30.8 Окна	18 дней	Пт 05.04.24	Пт 03.05.24		
423		30.9 Внутренние электромонтажные работы	19 дней	Пт 16.02.24	Пт 15.03.24		
424		30.10 Внутренние сантехнические работы	20 дней	Пт 01.03.24	Пт 29.03.24		
425		30.11 Отделка (черновая), в т.ч. спец. помещения с окраской за 1 раз)	20 дней	Пт 17.05.24	Пт 14.06.24		
426		30.12 Отделка (чистовая), вкл. МГН	21 дней	Пт 06.09.24	Пт 04.10.24		
427		30.13 Вертикальный транспорт	19 дней	Пт 03.05.24	Пт 31.05.24		
428		30.14 Монтаж оборудования для водоподготовки бассейна	21 дней	Пт 15.11.24	Пт 13.12.24		
429		30.15 Слаботочные системы	19 дней	Пт 03.05.24	Пт 31.05.24		
430		30.16 ИТП	18 дней	Пт 05.04.24	Пт 03.05.24		
431		30.17 Монтируемое оборудование	17 дней	Пт 06.12.24	Пт 03.01.25		
432		30.18 Устройство наружных сетей водопровода и канализации	19 дней	Пт 03.05.24	Пт 31.05.24		
433		30.19 Устройство наружных сетей теплоснабжения	20 дней	Пт 07.06.24	Пт 05.07.24		
434		30.20 Устройство наружных сетей электроснабжения	21 дней	Пт 05.07.24	Пт 02.08.24		
435		30.21 Устройство наружных сетей связи	21 дней	Пт 02.08.24	Пт 30.08.24		
436		30.22 Устройство сетей наружного освещения	21 дней	Пт 02.08.24	Пт 30.08.24		
437		30.23 Благоустройство, вкл. МГН	21 дней	Пт 02.08.24	Пт 30.08.24		
438		30.24 Мероприятия по вводу в эксплуатацию	21 дней	Пт 07.03.25	Пт 04.04.25
